Форма паспорта лин-проекта

ГБНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат

(наименование структурного подразделения Администрации К емеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Улучшение процесса коррекции девиантного поведения обучающихся (название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ

Е.В. Мурышкина, директор ГБНОУ «ГМЛИ»

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)

Е.В. Мурышкина

(подпись) (И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: ГБНОУ «ГМЛИ»

Процесс: процесс коррекции девиантного поведения обучающихся

Границы процесса: от факта выявления девиации у обучающегося до составления

программы коррекционной работы

Руководитель проекта зам. дир по УВР Е.М. Прилуцкая

Команда проекта Мурышкина Е.В., директор, Курганова Е.Н., соц. пед/воспитатель,

Исмоилова Т.В., ст. воспитатель

Цели и эффекты: повышение эффективности коррекции девиантоного поведения обучающихся

Наименование	Наименование Текущий Цє	
цели, ед. изм.	показатель	показатель
Сокращение повторных фактов девиантного	3 факта	0 фактов
поведения обучающихся за год		
Сокращение времени при сборе документов	22 дня	3 день
при выявлении факта девиации среди		
обучающихся		
Сокращение времени при составлении плана	10 дней	1 день
коррекционной работы		

Эффекты: сокращение повторных фактов девиантного поведения среди обучающихся ГБНОУ «ГМЛИ»
Проведение эффективной коррекционной работы


Обоснование:

- 1. Регулярное наличие фактов девиации у обучающихся.
- Отсутствие порядка сбора документов при выявлении девиантной ситуации.
- 3. Отсутствие индивидуального подхода при реализации профилакической работы с обучающимися

Сроки

- 1Согласование паспорта лин-проекта «18» сентября 2020 г.
- 2. Картирование текущего состояния (с «22» сен 2020 г. по «26» сен 2020 г.)
- 3. Анализ проблем и потерь (с «01» окт 2020 г. по «09» окт 2020 г.)
- 4. Разработка плана мероприятий (с «19» окт 2020 г. по «30» окт 2020 г.)
- 5. Защита плана мероприятий перед заказчиком (с «02» ноября 2020 г. по «08» ноября 2020г.)
- 6. Внедрение улучшений (с «09» ноября 2020 г. по «16» ноября 2020 г.)
- 7. Составление карты целевого состояния (с «18» ноября 2020 г. по «25» ноября 2020г.)
- 8. Мониторинг результатов (с «30» ноября 2020г. по «10» декабря 2020 г.)
- 9. Закрытие лин-проекта («11» декабря 2020 г.)
- 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов («15» января 2020г. «20» января 2020 г.)

КПСУ Тек. сося на 21.09.1010г. BMT: 22 pru Прочесс: (кор. дев. повер. Обук) Начало пр. 22 09, 20 гог. Окоиг. пр. 12.10. 2020 г. brush gracia getu aques MPC4 Upaalbull Coltaluul injudig kap. nadera.



negarous becays Upurue - ger Oresterus Hey pages. 40 mun 010/ 11 gener

coerabe as juneary yey lover mylogun yey ley low yern 01 01 (13end)

regarous

3 decreve ad ruy


4 acres e represente Joney My Course 01 03 (2 gen)


hydregenue nep coberhackanabes no buying 20 men 03.01 (spens)


1 Cocrabiline Harriceme Jasuros O cayou pacered 0301 (spens)

Museus tepeger ymenge secured surper 10 seech 03 Ol (1 pens) I Correberne margarine и важение процения принцинатий пенесом


Врешя пробевания презесей: 4 рив.

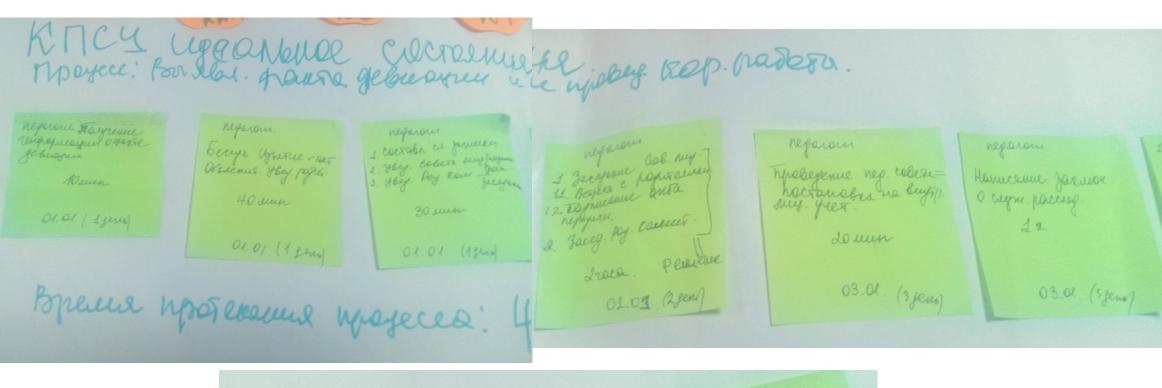



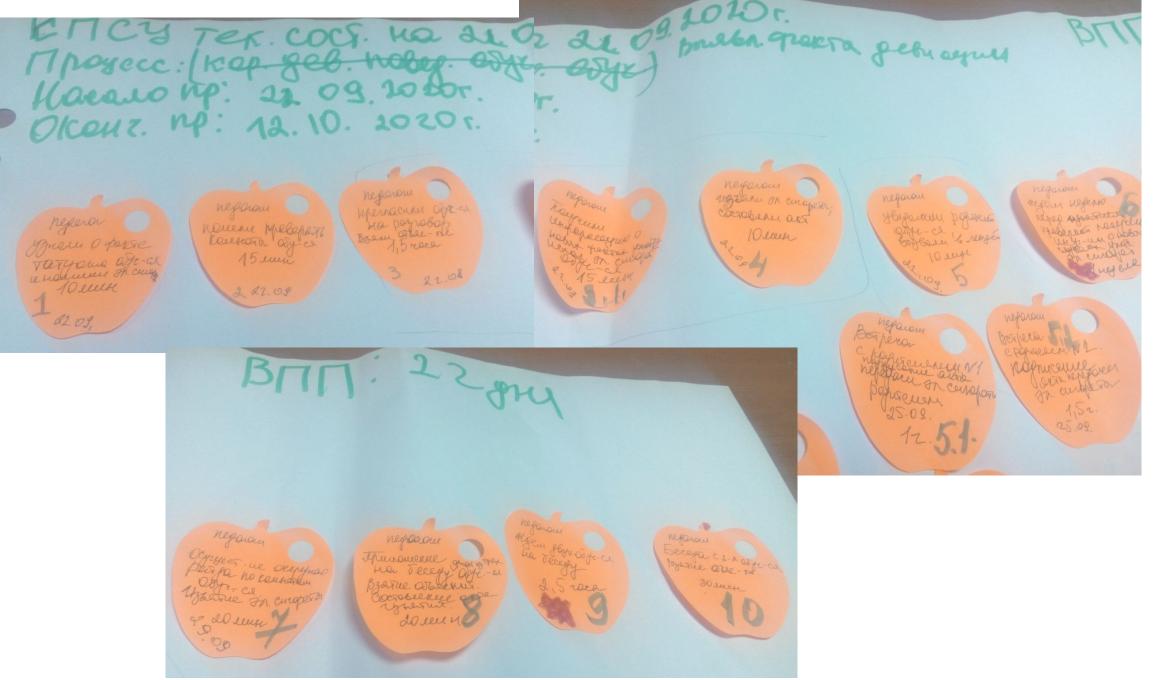









КПСЦ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ

Процесс: КОРРЕКЦИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

начало процесса: 21.11.2020г. окончание процесса: 03.12.2020г.

Ожидание выхода из отпуска зам. дир. по УВР 3 дня

Узнали о факте нарушения **20.11.**

Зам. дир. УР

Составление служебной записки, оповещение администрации 21.11

Комиссия

Взятие объяснительной с обучающегося, составление уведомление дл родителей, приглашение родителей 23.11

Комиссия

Уведомление родителей **24.11**

Зам. дир. УВР

Проведение заседания родительского комитета **26.11**

Зам. дир. УВР

Проведение заседания Совета лицеиста 27.11

Зам. дир. УВР

Составление заключения **01.12**

Секретарь

Составление приказа **02.12**

Зам. дир. УВР

Составление коррекционной программы **03.12**


Потеря времени из-за отсутствие алгоритма действий комиссии 4 дня

Не поставили на ВЛК

ВПП: 12 дней

Полезное время: 5 дней Потери времени: 9 дней

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОТЪЕЗДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ГБНОУ «ГМЛИ» ДОМОЙ НА КАНИКУЛЫ

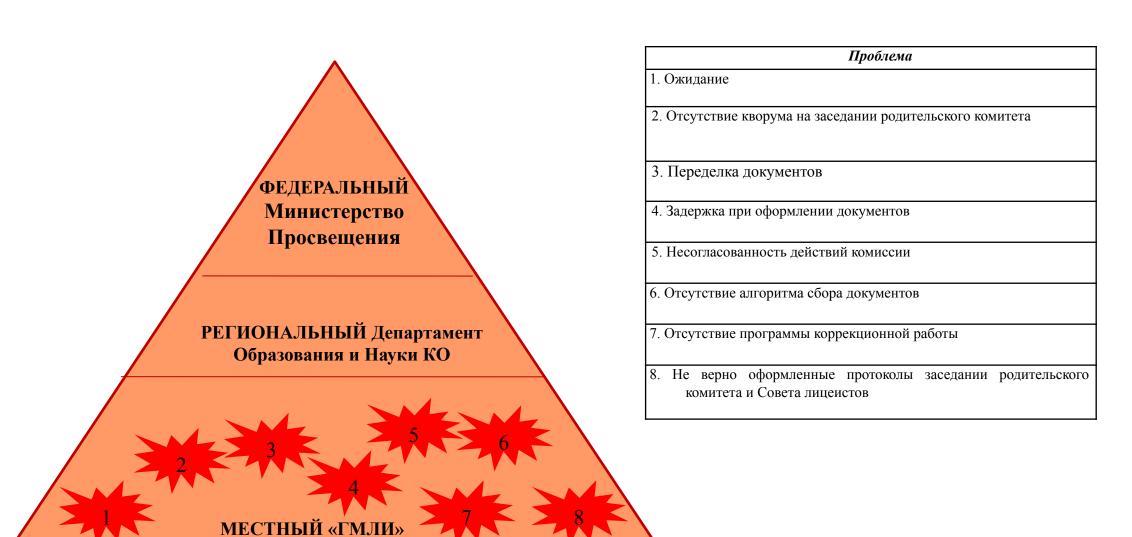

Дорожная карта (план действий) по реализации проекта «Улучшение процесса коррекции девиантного поведения обучающихся»

(подпись)

Проблема	Решение проблемы	Ожидаемый результат	Ответственный	Срок исполнения
Ожидание	Составление порядка сбора документов	Документы будут собранны в установленный срок	Курганова Е.В.	21.12.2020.
Не верно оформленные протоколы заседании родительского комитета и Совета лицеистов	Составить бланки протоколов заседания Сов. лицеистов и род.ком.	Правильность и четкость оформление документации	Прилуцкая Е.М.	18.12.2020.
Несогласованность действий комиссии	Разработка алгоритма работы комиссии	Четкие, последовательные действия комиссии, приводящие к сокращению временных затрат и выполнению более эффективной работы	Курганова Е.В. Прилуцкая Е.М.	21.12.2020.
Отсутствие кворума на заседании родительского комитета	Проводить он-лайн встречи	Присутствие всех представителей родительского комитата на заседании	Прилуцкая Е.М.	
Отсутствие программы коррекционной работы	Разработать программу коррекционной работы	Эффективное проведение коррекционной работы, сокращение повторных фактов девиации.	Прилуцкая Е.М.	21.12.2020.
